




ANEXO ETAPA DE CONTRATACIÓN


Actividad	Flujograma	Entrada	Salida	Responsable
Firma del Contrato				
Elaboración Contrato y Anexos				Jurídico Encargado Contratación
Comunicación de fecha de firma contrato y entrega de Garantías Contractuales				Encargado Contratación
Firma del Contrato				Ordenador del Gasto Contratista
Entrega de Garantías Contractuales				Contratista
Aprobación de las Garantías Contractuales				Jurídico
Registro Presupuestal del Contrato				Financiero
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Continua el proceso				

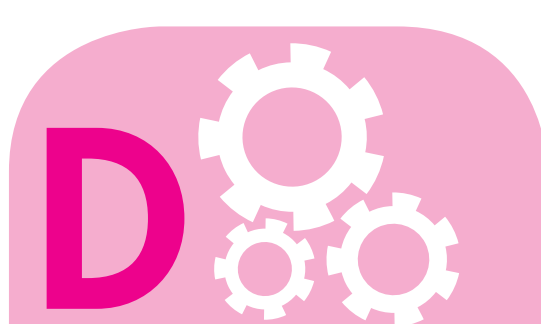

ANEXO ETAPA DE EJECUCIÓN

Actividad	Flujograma	Entrada	Salida	Responsable
Inicio del Contrato				Supervisor - Interventor - Contratista
El contrato exige Acta de Inicio				
Identificación del Contrato				Supervisor - Interventor
Cronograma (Actividades y fechas)				Supervisor - Interventor - Contratista
Relación de Recursos aportados por las partes				Supervisor - Interventor - Contratista
Obligaciones o consideraciones Especiales				Supervisor - Interventor - Contratista
Consolidación Documento				Supervisor - Interventor - Contratista
Firma del Acta				Supervisor - Interventor - Contratista
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Continua el proceso				
Informes de Ejecución Periódicos				
Elaboración de Informe				Contratista
Revisión de Informes Periódicos				Supervisor - Interventor
Corresponde al Desarrollo del Periodo				Supervisor - Interventor
Solicitud de ajustes				Supervisor - Interventor
Entrega Informe Ajustado				Contratista
Aprobación del Informe				Supervisor - Interventor
Continua el proceso				
Modificaciones Contractuales				
Solicitud de Modificación Contractual				Contratista
Análisis de la Solicitud				Supervisor - Interventor
Procede Modificación Contractual				Supervisor - Interventor
Elaboración Otrosí				Jurídico
Firma del Otrosí				Ordenador del Gasto - Contratista
Implica Modificar Garantías Contractuales				Contratista
Entrega de Modificatorios				Contratista
Respuesta Solicitud				Ordenador del Gasto - Contratista
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Continua el proceso				
Cierre del Contrato				
Elaboración Acta de Cierre				Supervisor - Interventor
Notificación del Cierre del Contrato				Ordenador del Gasto
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Continua el proceso				

NOTA: Ver el Afiche 4 para el detalle de las actividades de Supervisión / Interventoría

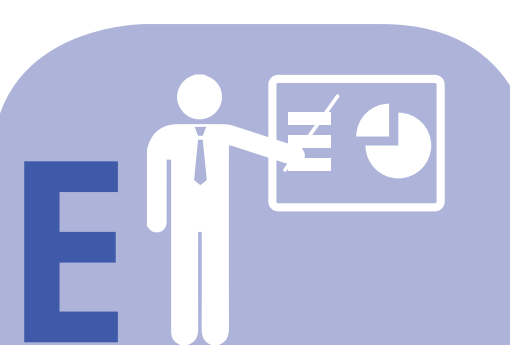

ANEXO ETAPA DE TERMINACIÓN

Actividad	Flujograma	Entrada	Salida	Responsable
Liquidación del Contrato				
Convocatoria o Notificación a Liquidar Bilateralmente el Contrato				Ordenador del Gasto
Asisten a la reunión				Ordenador del Gasto Contratista
Revisión de cumplimientos y pendientes				Supervisor - Interventor - Contratista
Se presentan salvedades				Supervisor - Interventor - Contratista
Dejar constancias				Supervisor - Interventor - Contratista
Hay Común Acuerdo				
Acta de Liquidación de Común Acuerdo				Ordenador del Gasto Contratista
Certificación de No Asistencia o de No Acuerdo				
Realización de Liquidación Unilateral del Contrato				Ordenador del Gasto
Elaboración del Acto Administrativo de Liquidación Unilateral				Supervisor Interventor
Notificación Acto Administrativo de Liquidación Unilateral				
Interponen Recurso de Reposición				Contratista
Respuesta al Recurso				Ordenador del Gasto - Supervisor Interventor
Liquidación en Firma				
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Continua el proceso				
Verificación de Compromisos de largo plazo				
Revisión de los Compromisos a largo plazo				Encargado Contratación
Notificación del Compromiso a vencer				Ordenador del Gasto
Verificación del cumplimiento				Encargado Contratación
Acta de Cumplimiento del Compromiso				Ordenador del Gasto
Continua el proceso				
Custodia y Gestión de Garantías Contractuales				
Revisión de las Garantías Contractuales Vigentes				Encargado Contratación
Se presenta Hecho Generador de Reclamación (Sinistro)				Encargado Contratación
Preparar Reclamación Aseguradora				Encargado Contratación
Presentación de Reclamación				Ordenador del Gasto
Pago Reclamación				Aseguradora
Acta de Vencimiento Garantía/Amparo				Ordenador del Gasto
Continua el proceso				
Acta de Cierre del Expediente				
Revisión de los Compromisos y de las Garantías Contractuales a largo plazo				Encargado Contratación
Se cumplieron los Compromisos y no hay Sinistros				Encargado Contratación
Preparar Comunicación				Encargado Contratación
Envío Comunicación				Ordenador del Gasto
Respuesta Comunicación				Contratista Aseguradora
Acto Administrativo de Cierre del Expediente Contractual				Ordenador del Gasto
Publicación en el SECOP y WEB de la Entidad				Encargado SECOP
Cierre del proceso				
Atención requerimientos Entidades de Control				
Comunicado Visita o Solicitud de Información Entidad de Control				Entidad de Control
Recopilación de Información Pertinente				Encargado de Contratación
Análisis de la Información				Jurídico - Financiero - Técnico
Preparación de Respuesta				Encargado de Contratación
Envío de Respuesta				Ordenador del Gasto
Hay Merito a Sanciones				Entidad de Control
Acciones de Repetición o Pertinentes				Encargado Contratación
Cierre del Caso				
